

ご近隣の皆様へ

目黒線奥沢駅改修工事 3月の工事予定


平素より東急線鉄道事業にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。目黒線奥沢駅改修工事について、下記の工程表に基づき実施する予定であります。作業によっては比較的大きな音の出る作業が伴います。工事中は何かとご迷惑をお掛けいたしますが、何卒、皆様方のご理解ご協力の程宜しくお願い申し上げます。

工程表

■ : 昼間作業(8:00~18:00予定) ■ : 夜間作業(22:00~翌6:00予定) ■ : 昼夜間作業(8:00~18:00、22:00~翌6:00予定)

工種	2020年2月					2020年3月															2020年4月					備考																
	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
① 土木工事	仮設工事	資器材搬入出、木材加工ほか																									昼夜間作業にて工事ヤードの資器材の搬入出を行います。昼間作業にて材料の加工等を行います。夜間、車両が入り出します。															
	ヤード整備	工事ヤード整備(仮囲い設置、列車防護柵設置、搬入路設置)																									昼間作業にて車庫内の仮囲い設置、搬入路設置を行います。															
	ホーム撤去	上りホーム一部撤去																				上りホーム一部撤去、仮囲い盛替え					昼夜間作業にてホーム撤去、仮囲いの盛替えを行います。															
	木製覆工設置	木製覆工設置																									夜間作業にて軌道内に木製覆工を設置します。															
	基礎工事						基礎杭準備工															基礎杭打設					夜間作業にて基礎杭の施工を行います。															
② 保線工事	車庫内工事	軌框撤去					軌框撤去															軌道撤去					昼夜間作業にて軌道撤去、レール運搬、発生材搬出を行います。															
	本線工事	発生材運搬					発生材運搬															発生材運搬																				
③ 電気工事	車庫内工事	発生材運搬					発生材運搬															発生材運搬																				
	本線工事	発生材運搬					発生材運搬															発生材運搬																				
	新設電路柱基礎構築	電路柱基礎構築																									夜間作業にて電路柱の施工を行います。															
	架線調整						架線調整															予備					夜間作業にて架空線の調整を行います。															
④ 建築工事	仮A口	通路切替準備																									昼間作業にて通路の整備工事を行います。夜間作業にてA口切替を行います。															
	下りトイレ現A口駅舎解体工事						仮囲い設置															内装解体、解体材搬出					夜間作業にて仮囲いを設置します。昼夜間作業にて建物の解体作業、解体材搬出作業を行います。															
⑤ その他																																										

※電車の運行等により作業内容を変更する場合がございます。

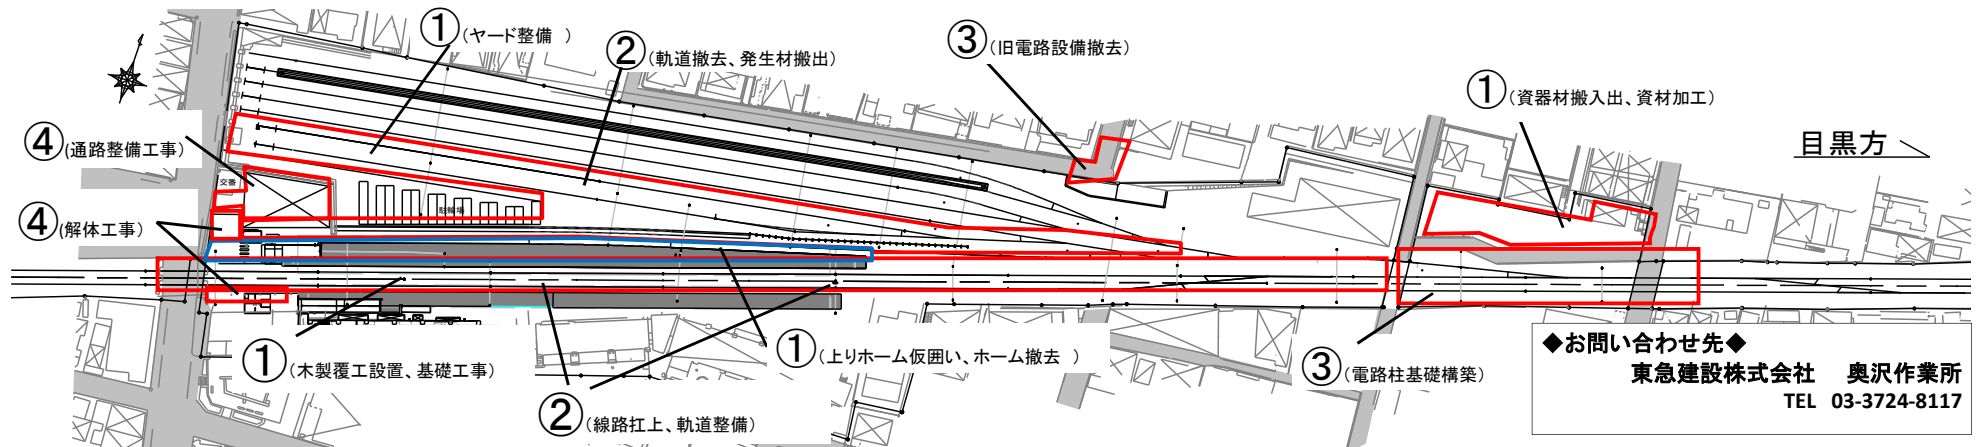

◆お問い合わせ先◆
東急建設株式会社 奥沢作業所
 TEL 03-3724-8117
